



● INTRANET CORPORATIVA

Universo SL

Portal de intranet da Salon Line —
panorama do que foi entregue,
cronograma até o go-live e
acompanhamento das funcionalidades.

Plataforma no ar:

intranet-universo-sl.vercel.app

Resumo do momento:

o projeto segue o cronograma combinado, com foco em **testes com o cliente em 18/06** e **go-live em 21/06**.

VISÃO GERAL

O projeto evoluiu com solidez; agora entramos na etapa de fechamento e validação.

O protótipo inicial tinha cerca de 10 funcionalidades. A matriz atual reúne 52 itens, com 29 já em produção. Até 18/06, o foco é disponibilizar a plataforma para os testes com o cliente.

Dentro do prazo

52

itens mapeados na matriz

29

já em produção


18/06

Testes cliente

21/06

Go-live

Leitura executiva da matriz

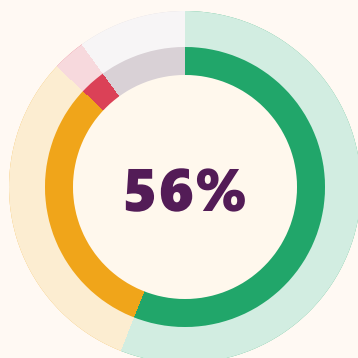

● Feito em produção	29 itens
● Parcial por credencial/integração	16 itens
● Em aberto / a iniciar	2 itens
● Em análise ou substituído de forma controlada	5 itens

O que precisa ficar visível

1

Prazo batendo

O plano mostra Agenda com Negócio, Início do Desenvolvimento, Liberação para testes e Go-live nos marcos corretos.

2

Evolução do escopo

Partimos de um protótipo de referência para uma plataforma com banco de dados, armazenamento, autenticação, CMS, dados reais e 29 entregas em produção.

3

Fase 2 definida

Após o go-live, a evolução prevista concentra-se em Jandira e integração Protheus (RH).

TIMELINE

Timeline do projeto

Clique nos marcos para ver o papel de cada etapa no cronograma do Universo SL.

Go-live 21/06



18/06/2026 · TESTES · Testes cliente

Plataforma disponibilizada para os testes de usuário do cliente.

03/06/2026 · AGENDA · Agenda com Negócio

Alinhamento preliminar de requisitos funcionais.

08/06/2026 · DESENV. · Início do Desenvolvimento

Abertura de sprints e setup inicial.

18/06/2026 · TESTES · Testes cliente

Plataforma disponibilizada para os testes de usuário do cliente.

21/06/2026 · GO-LIVE · Go-live

Lançamento oficial após homologação bem-sucedida. Fase 2 prevista com Jandira e Protheus.

FASE 2

Fase 2: evolução após o go-live.

Conforme alinhado com o negócio, a Fase 2 do projeto concentra-se em Jandira e Protheus. As demais integrações (e-mail, WhatsApp, Oracle, IA e canais) seguem no escopo da Fase 1 e dependem de credenciais do cliente para ativação.

Fase 2 planejada

Fase 2 do projeto

Jandira

Versão simplificada da unidade

Adaptação da intranet para a unidade Jandira, com particularidades operacionais da operação local.

Protheus

Integração RH (Protheus)

Base confiável de colaboradores, cargos, áreas e aniversários para segmentação e módulos de RH.

Integrações da Fase 1 — aguardando credencial

Canais

E-mail, WhatsApp e push

Conectores preparados; ativação depende de contrato, credenciais e templates aprovados.

Vitrine

Oracle / e-commerce

Kits já visíveis na plataforma; mecânica transacional aguarda credencial do parceiro.

IA

Resumo e assistente

Funcionalidades prontas; operação completa depende de chave de inteligência artificial e agendamento.

SSO

Login Google corporativo

Autenticação preparada; aguarda credencial OAuth do cliente.

Como contar a história

A

Agora

Liberar a plataforma para testes do cliente em 18/06.

B

Go-live

Garantir homologação, monitoramento e inauguração oficial em 21/06.

C

Depois

Fase 2 com Jandira e Protheus; integrações da Fase 1 seguem conforme liberação de acessos.

Matriz de funcionalidades do projeto

Detalhamento dos 52 itens mapeados, com fase e status atual de cada entrega.

52
itens

#1 · Fundação Banco de dados e storage

Concluído

Fase 1 · Neon em produção + R2 provisionado; upload de mídia e imagens reais funcionando.

#2 · Fundação Acesso sem login restrito à rede

Em análise

Fase 1 · Em avaliação: substituído por login obrigatório — decisão de arquitetura.

#3 · Fundação Feature flags e health endpoints

Concluído

Fase 1 · 13 feature flags + endpoints /api/health/*.

#4 · Fundação Testes E2E e responsividade

Concluído

Fase 1 · Testes automatizados ponta a ponta + 101 testes + integração contínua; responsivo a partir de 375px.

#5 · Autenticação Login admin Google SSO + RBAC

Em andamento

Fase 1 · RBAC em produção; Google SSO depende de credencial OAuth do cliente.

#6 · Autenticação Gestão de usuários administradores

Concluído

Fase 1 · /admin/usuarios — CRUD completo.

#7 · Home Carrossel de banners + slots posicionáveis

Concluído

Fase 1 · Hero + blocos (slots 1–6) + admin, com imagens reais.

#8 · Home Agenda, aniversariantes e últimas notícias

Concluído

Fase 1 · Mural + aniversariantes (CSV) + últimas matérias.

#9 · Home Atalhos por área e TV Salon Line

Concluído

Fase 1 · Links úteis por área + embed Pluto.tv.

#10 · Acontece Lista, filtro e detalhe de notícias

Concluído

Fase 1 · Filtro por categoria + detalhe Markdown; posts com imagem real.

#11 · Acontece URL compartilhável e like por matéria

Concluído

#12 · Acontece Pop-up de destaque ao entrar

Concluído

Fase 1 · Modal 1×/sessão configurável em /admin/destaque.

Fase 1 · /acontece/[slug] + copiar link + like idempotente.

#13 · Pessoas
Nosso Time — diretório e perfil

Concluído

Fase 1 · 29 colaboradores reais (LinkedIn), 26 com foto no R2; busca por nome.

#14 · Vagas
Vagas internas com link Solides

Concluído

Fase 1 · /vagas + admin + 12 vagas + link Solides.

#15 · CMS
CMS — banners, notícias, agenda e vagas

Concluído

Fase 1 · CRUD completo + ocultar sem deletar + upload R2.

#16 · CMS
CMS — atalhos, aniversariantes (CSV) e pop-up

Concluído

Fase 1 · Import CSV + atalhos por área + config do pop-up.

#17 · Descoberta
Busca global multi-entidade

Concluído

V1.1 · Já disponível — header + /busca segmentado (matéria/pessoa/atalho/vaga).

#18 · Pessoas
Widget de novos colaboradores

Concluído

V1.1 · Já disponível — destaque de novos colaboradores na Home.

#19 · Acontece
Segmentação de conteúdo por área

Em andamento

V1.1 · Filtro por categoria ok; por área do colaborador depende de Protheus.

#20 · Newsletter
E-mail transacional (Responsys)

Em andamento

V2 · Conector de e-mail preparado; falta contrato e credencial Responsys.

#21 · Newsletter
WhatsApp Business

Em andamento

V2 · Conector WhatsApp preparado; falta credencial e aprovação de templates.

#22 · Newsletter
Cadastro e preferências de comunicação

Concluído

V2 · Já disponível — canais + frequência + categorias.

#23 · Newsletter
Digest semanal automático

Em andamento

V2 · Agendamento preparado; falta credencial e canal de envio ativo.

#24 · Resumo IA
Widget 'Resumo da Semana' + chat IA

Concluído

V2 · Já disponível — widget e chat inline com inteligência artificial.

#25 · Resumo IA
Agente de sumarização (backend)

Em andamento

V2 · Base de IA preparada; falta credencial de inteligência artificial para ativação.

#26 · Resumo IA
Job agendado + moderação editorial

Em andamento

V2 · Revisão em /admin/resumo-ia; depende de agendamento automático e credencial de IA.

#27 · Resumo IA
Busca semântica e alertas proativos

Em andamento

V3 · Flag SEMANTIC_SEARCH presente; alertas proativos não implementados.

#29 · Vitrine
Configuração de cupom

Em andamento

V2 · Estrutura pronta; mecânica fina + parceria e-commerce pendente.

#31 · Vitrine
Cards de kits em Benefícios

Concluído

V2 · Já disponível — KitCard/FeaturedKit na Vitrine.

#33 · Vitrine
Push notification de novo kit

Em andamento

V2 · Notificação web preparada; falta credencial e ativação final.

#35 · Vitrine
Relatório de resgates e validade

Concluído

V2 · Já disponível — /admin/kits/relatorio.

#37 · Comunicação
Notificações in-app com confirmação de leitura

Concluído

V2 · Já disponível — sino de notificações com controle de leitura no painel administrativo.

#39 · RH
Protheus/RH ou import planilha

Em andamento

Fase 2 · Fase 2 do projeto; importação por planilha disponível; integração Protheus depende de credencial.

#41 · Produto
Versão Jandira simplificada

A iniciar

#28 · Vitrine
Seletor de produtos Oracle para kits

Em andamento

V2 · 4 kits com produtos reais; transacional depende de credencial Oracle.

#30 · Vitrine
Publicação do kit com cupom único

Em andamento

V2 · RedeemButton pronto; unicidade real depende do e-commerce.

#32 · Vitrine
Kit em destaque (pop-up/banner)

Em andamento

V2 · Reaproveita o mecanismo de destaque da Fase 1.

#34 · Vitrine
E-mail de kit para colaboradores

Em andamento

V2 · Depende do Responsys (#20).

#36 · Engajamento
Comentários em notícias

Concluído

V2 · Já disponível — CommentsSection.

#38 · Comunicação
Comunicados segmentados por depto

Em andamento

V2 · Audiência ALL/área pronta; segmentação fina depende de Protheus.

#40 · RH
Treinamentos, benefícios e férias

Concluído

V2 · Treinamentos + Benefícios prontos; férias atrás de flag (aguarda RH).

#42 · Engajamento
Mapa interativo + avatar + check-in

Concluído

Fase 2 · Fase 2 do projeto; unidade existe no modelo, adaptação não iniciada.

V3 · Já disponível — mapa de presença no escritório.

#43 · Engajamento
Chat interno (DMs, grupos, presença)

Concluído

V3 · Já disponível — mensagens diretas, grupos e canal geral.

#44 · Resumo IA
Assistente IA corporativo 'Lina'

Concluído

V3 · Já disponível — assistente flutuante com inteligência artificial.

#45 · Fundação
Design System 'System B' (roxo)

Concluído

V3 · Já disponível — paleta disponível; default mantém rosa Salon.

#46 · Fundação
Dark mode

Concluído

V3 · Já disponível — claro/escuro/sistema.

#47 · RH
Relógio de ponto nativo

Em análise

Em análise · Em análise — ponto vem do Protheus; na intranet fica como atalho.

#48 · Comunicação
Ouvidoria

Em análise

Em análise · Em análise — não faz parte da prática atual da Salon Line.

#49 · Integrações
Integrações simuladas (UI sem backend)

Em análise

Em análise · Substituído por conectores reais com ativação por credencial.

#50 · Fundação
Persistência em localStorage

Em análise

Em análise · Substituído por banco de dados em nuvem — tudo persistido de forma segura.

#51 · Acontece
Sync automático do blog (WordPress → Acontece)

Concluído

Bônus · Cron horário; 40 posts sincronizados sob tag exclusiva 'Blog'.

#52 · Engajamento
Clarity (analytics)

A iniciar

Bônus · Novo item — mapear navegação/engajamento + mapa de acessos.
